

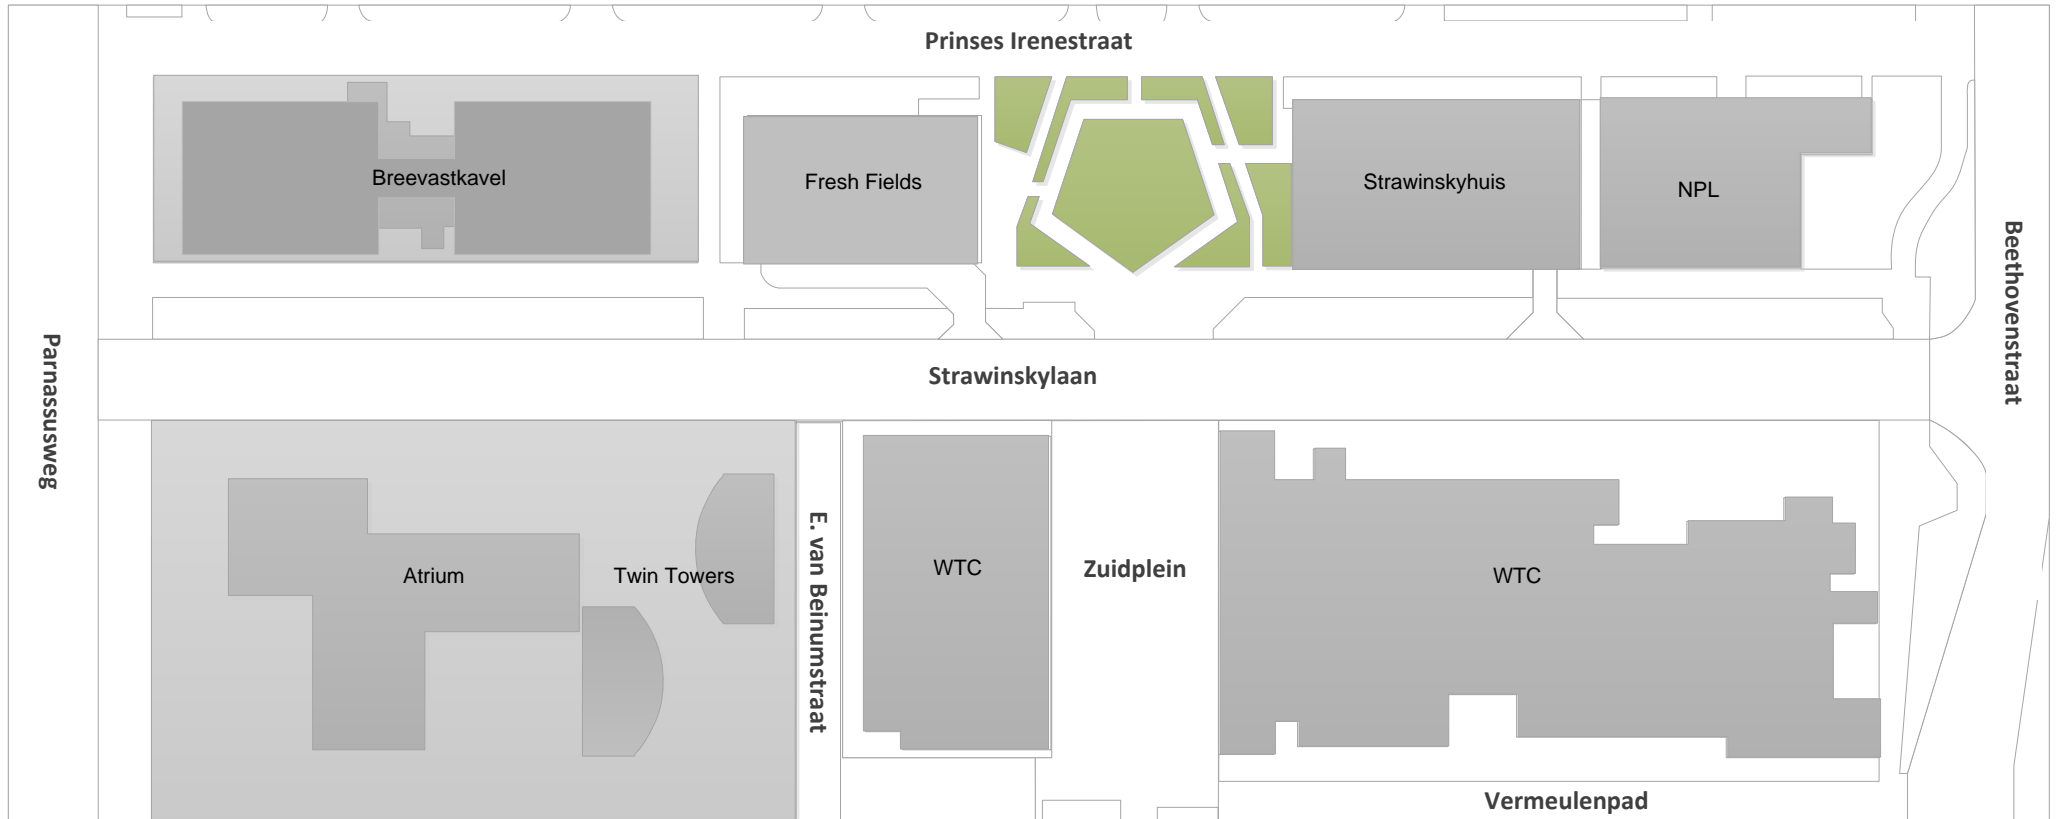


Strawinsky

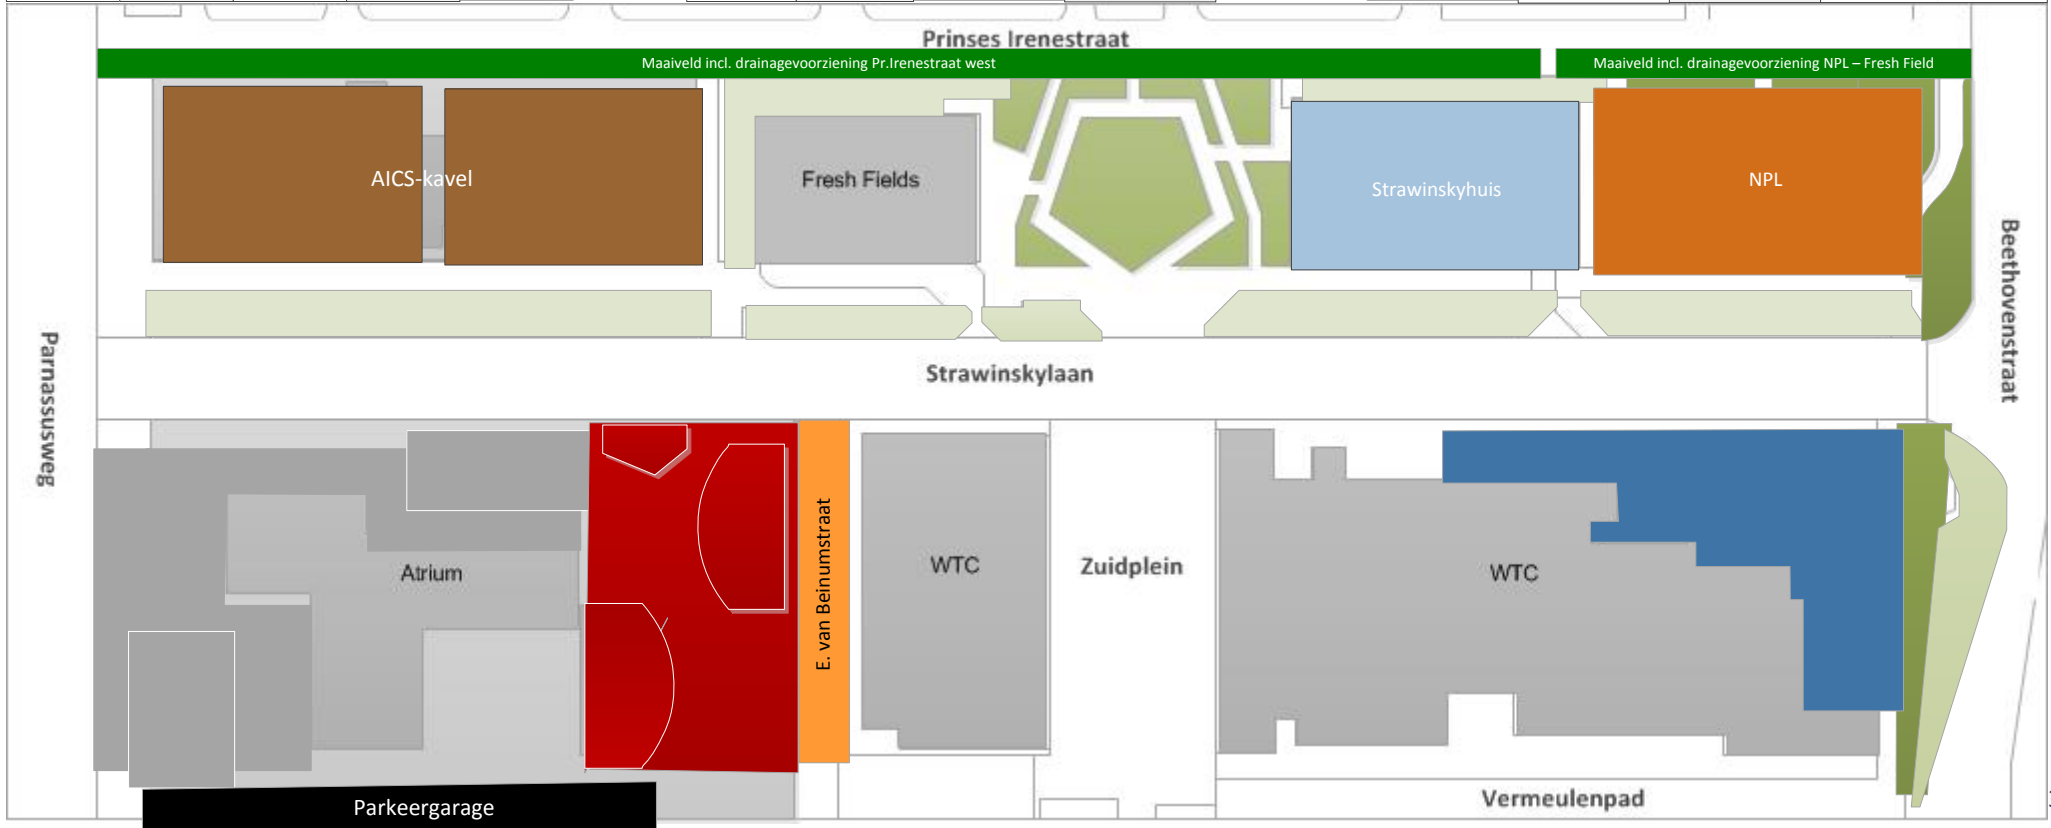

Strawinsky uitvoeringsplanning

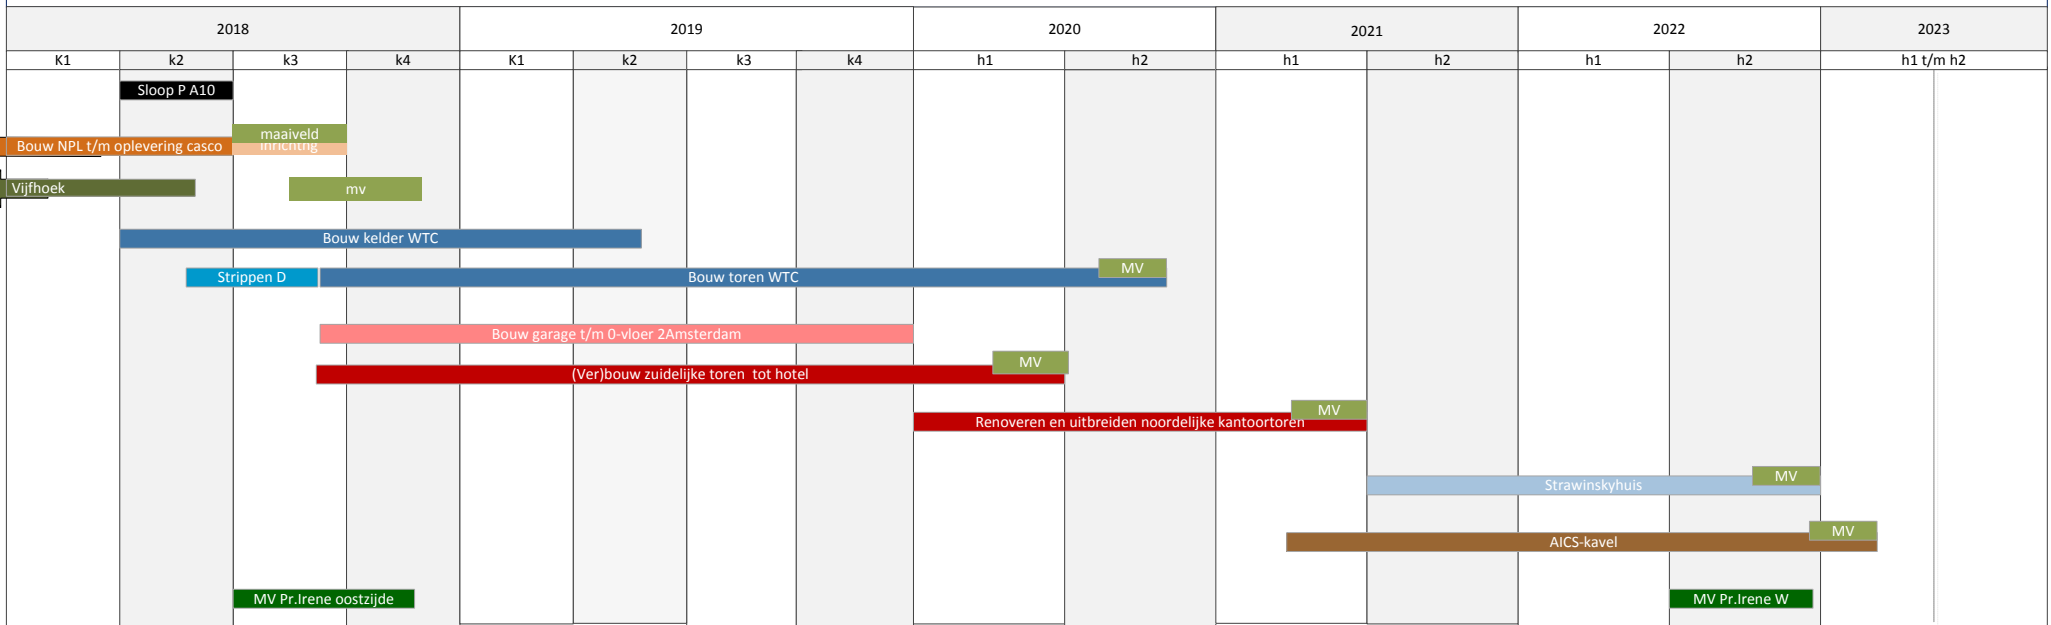

Stand van zaken bouwplannen

De bouw van het NPL gebouw loopt.

nadat het terrein ten oosten en noorden van WTC bouwrijp is gemaakt, starten in het tweede kwartaal de werkzaamheden voor de uitbreiding van de kelder van het WTC. Na de bouwvak wordt gestart met de werkzaamheden aan toren D.

De fietsparkeergarage Vijfhoek is begin 2e kwartaal gereed. Het terrein is tijdelijk ingericht voor fietsparkeren.

Medio augustus zijn de werkzaamheden aan de kabels en leidingen, groutankers e.a. 2Amsterdam afgerond, waarna gestart wordt met de bouw van de bak van de parkeergarage en de verbouw van de zuidelijke toren.

Maaiveld


In het eerste kwartaal wordt het terrein ten oosten en noorden van WTC bouwrijpgemaakt.

Tevens is gestart met het bouwrijpmaken voor 2Amsterdam.

In het tweede kwartaal van 2018 wordt gestart met de inrichting van het maaiveld NPL. Deze werkzaamheden zijn tegelijk gereed met de ingebruikname bouw van NPL.

Het maaiveld van de Vijfhoek is in het eerste kwartaal tijdelijk ingericht. Het terrein wordt in het derde en vierde kwartaal definitief ingericht.

Strawinsky 1e kwartaal 2018

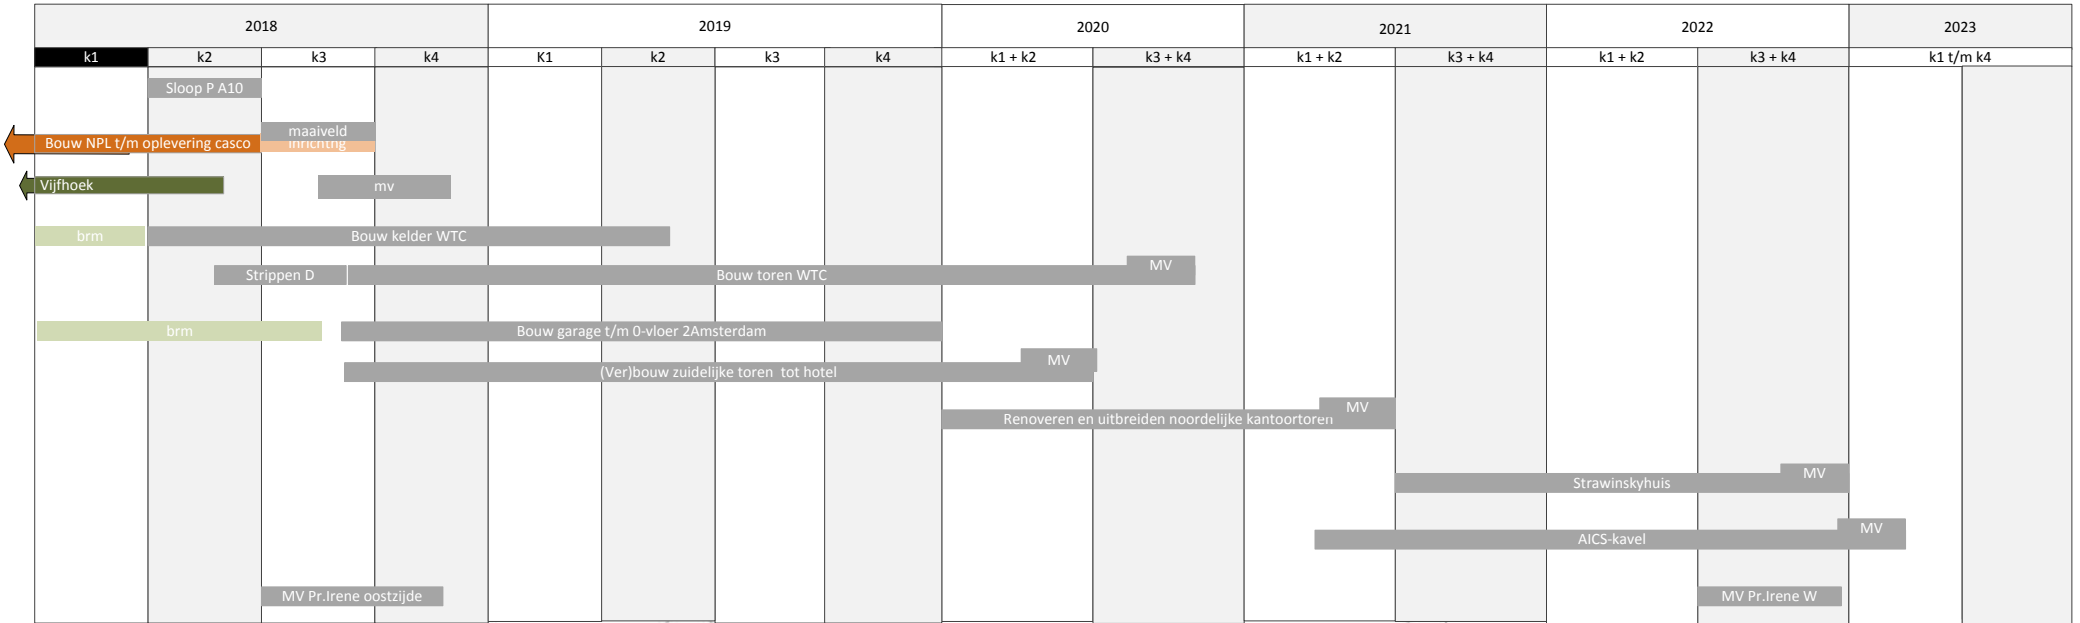

Stand van zaken bouwplannen

De fietsparkeergarage Vijfhoek wordt in het 2e kwartaal opgeleverd.

In dit kwartaal wordt de garage bij de A10 (2Amsterdam) gesloopt.

Begin derde kwartaal wordt het casco van het gebouw de NPL opgeleverd. Daarna start de inrichting en wordt het begin vierde kwartaal in gebruik genomen. Op 6 december 2018 is de feestelijke opening.

De werkzaamheden voor de uitbreiding van de parkeerkelder P1 en P2 WTC kunnen starten. Na de bouwvak wordt gestart met de werkzaamheden aan toren D.

Maaiveld

Eind tweede kwartaal van 2018 wordt gestart met de inrichting van het maaiveld NPL. Deze werkzaamheden zijn tegelijk gereed met de ingebruikname van NPL. Tevens wordt gestart met de werkzaamheden groenstrook Prinses Irenestraat oostzijde, ter hoogte van NPL.

Begin tweede kwartaal is het terrein bij het WTC bouwrijp.

Stand van zaken bouwplannen

Het casco van het gebouw de NPL wordt begin 3e kwartaal opgeleverd. De inrichting loopt tot begin vierde kwartaal, waarna het gebouw in gebruik genomen kan worden. Op 6 december 2018 is de feestelijke opening.

Begin 3e kwartaal wordt gestart met de werkzaamheden aan toren D van WTC. De werkzaamheden uitbreiding P1 en P2 zijn in het tweede kwartaal gestart en lopen door tot in het tweede kwartaal 2019.

Na de bouwvak wordt gestart met de bouw van de ondergrondse parkeerbak 2Amsterdam en de verbouw van de zuidelijke toren tot hotel.


Maaiveld

Eind tweede kwartaal is gestart met de inrichting van het maaiveld NPL. Deze werkzaamheden zijn tegelijk gereed met de ingebruikname van NPL. Tevens lopen de werkzaamheden aan de groenstrook Prinses Irenestraat, oostzijde.

De definitieve inrichting maaiveld Vijfhoek start na de bouwvak en is afgerond in de loop van het vierde kwartaal.

Het bouwrijpmaken 2Amsterdam loopt tot medio augustus 2018.

Strawinsky 3e kwartaal 2018

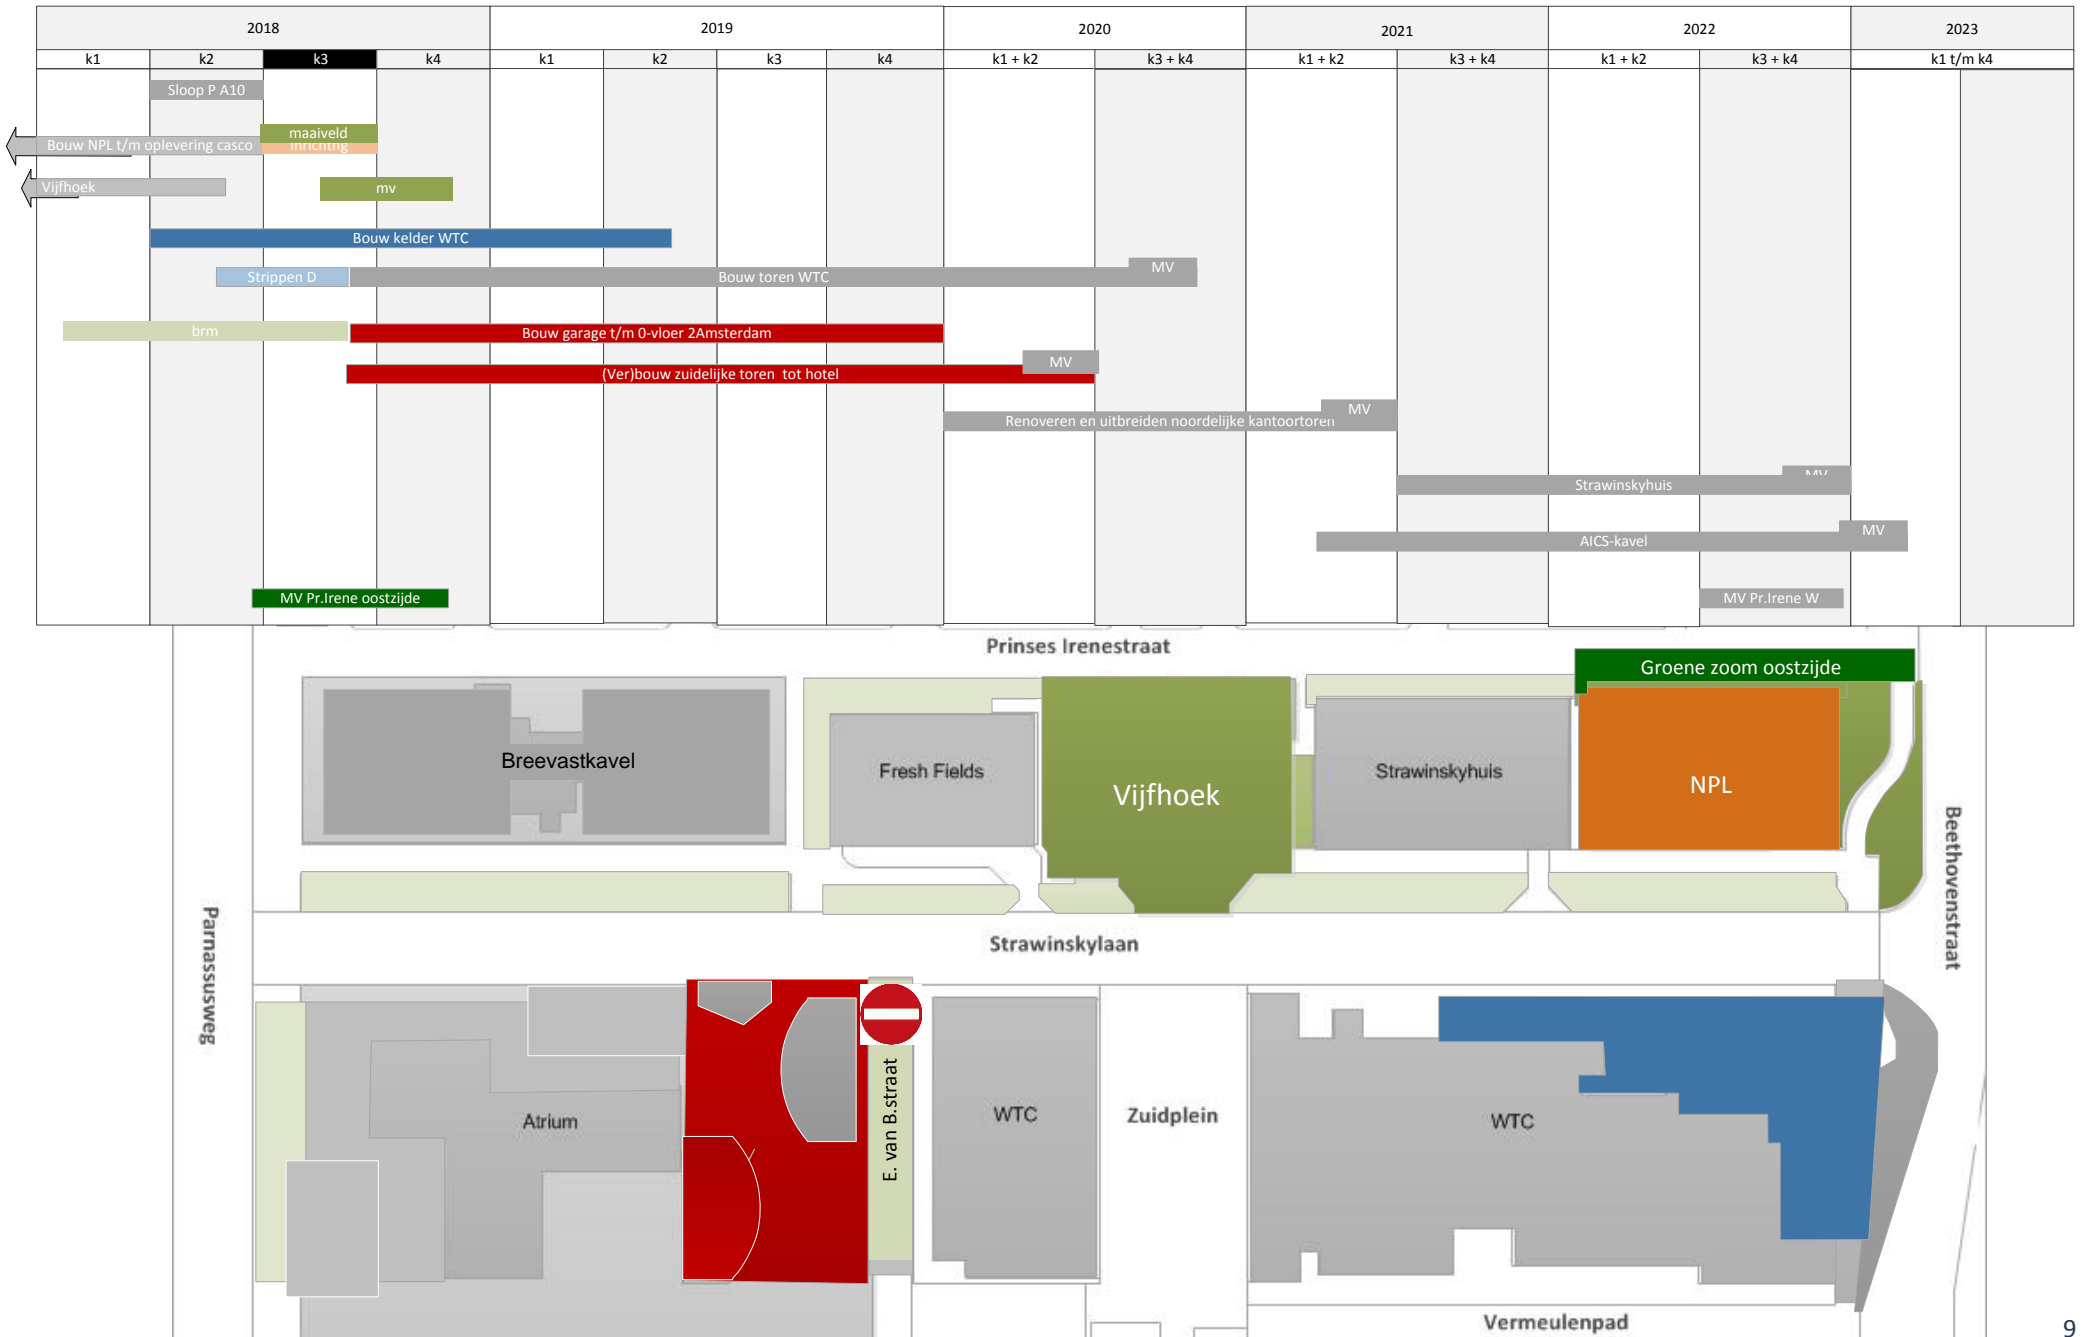

Stand van zaken bouwplannen

Het gebouw van de Goede Doelen Loterij is opgeleverd en in gebruik genomen. Op 6 december 2018 is de feestelijke opening.

De werkzaamheden aan toren D van WTC lopen, evenals van de uitbreiding P1 en P2 .


Het bouwrijpmaken 2Amsterdam is afgerond. Na de bouwvak is gestart met de bouw van de ondergrondse parkeerbak en de verbouw van de zuidelijke toren tot hotel.

Maaiveld

De inrichting van de Vijfhoek loopt tot in het vierde kwartaal, evenals de werkzaamheden aan de groenstrook Prinses Irenestraat, oostzijde.

Het talud van de Strawinskylaan wordt “netjes” gemaakt.

Strawinsky 4e kwartaal 2018

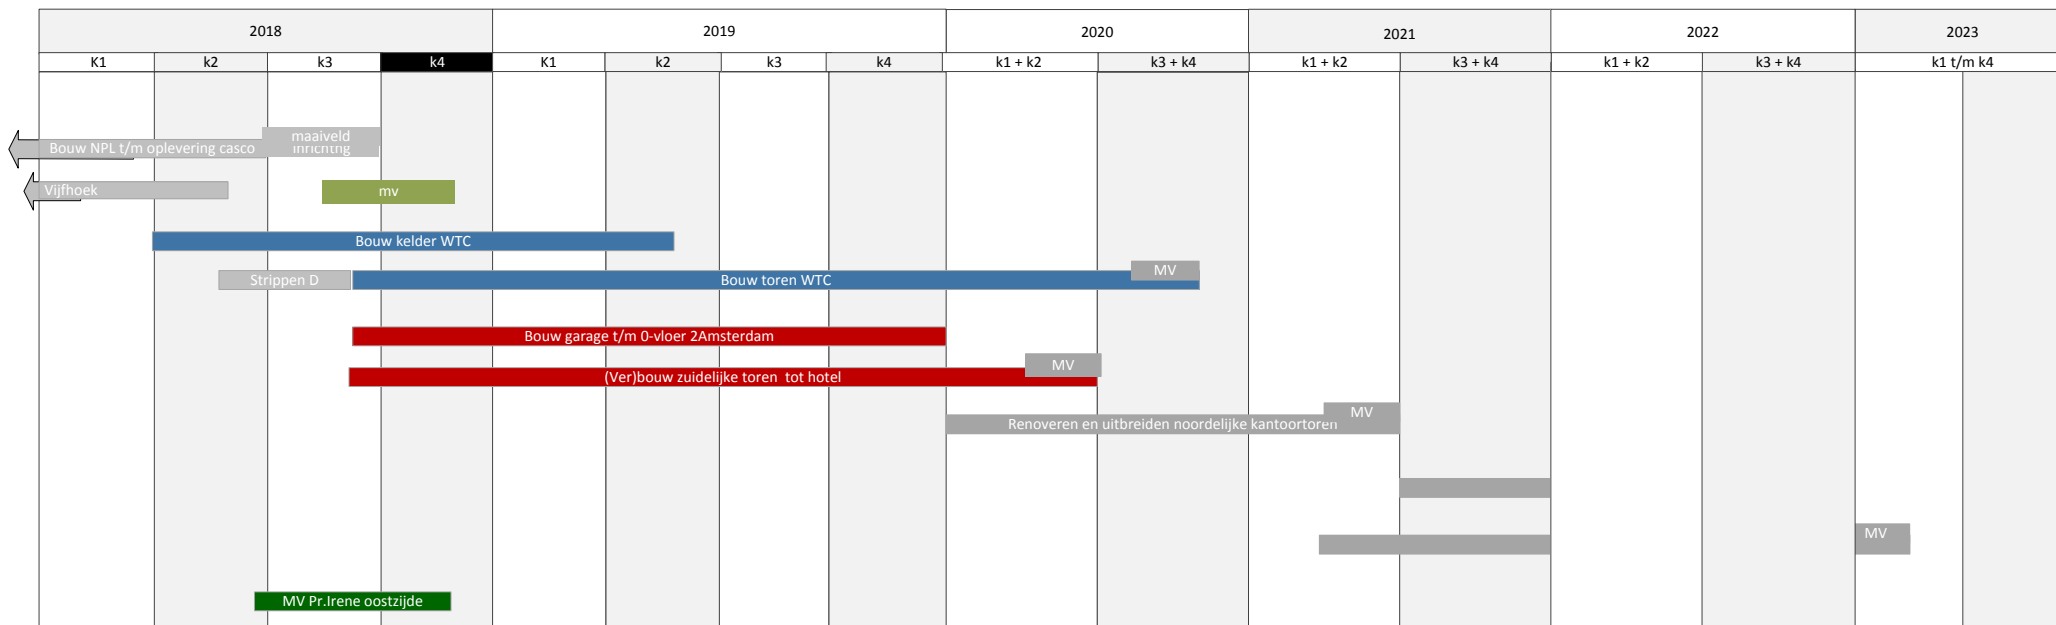

Strawinsky 1e en 2e kwartaal 2019

Stand van zaken bouwplannen

De werkzaamheden aan toren D van WTC lopen. De uitbreiding van de parkeergarage P1 en P2 is medio tweede kwartaal afgerond.


Bij 2Amsterdam lopen de werkzaamheden voor de ondergrondse parkeerbak en de verbouw van de zuidelijke toren. De parkeerbak is eind 2019 gereed, waarna met de (ver)bouw van de noordelijke toren wordt gestart. De zuidelijke toren is eind tweede kwartaal 2020 gereed.

Maaiveld

De inrichting van de Vijfhoek is sinds eind 2018 gereed, evenals de werkzaamheden aan de groenstrook Prinses Irenestraat, oostzijde.

Ook het talud van de Strawinskylaan is “netjes” gemaakt.

Strawinsky 1e en 2e kwartaal 2019

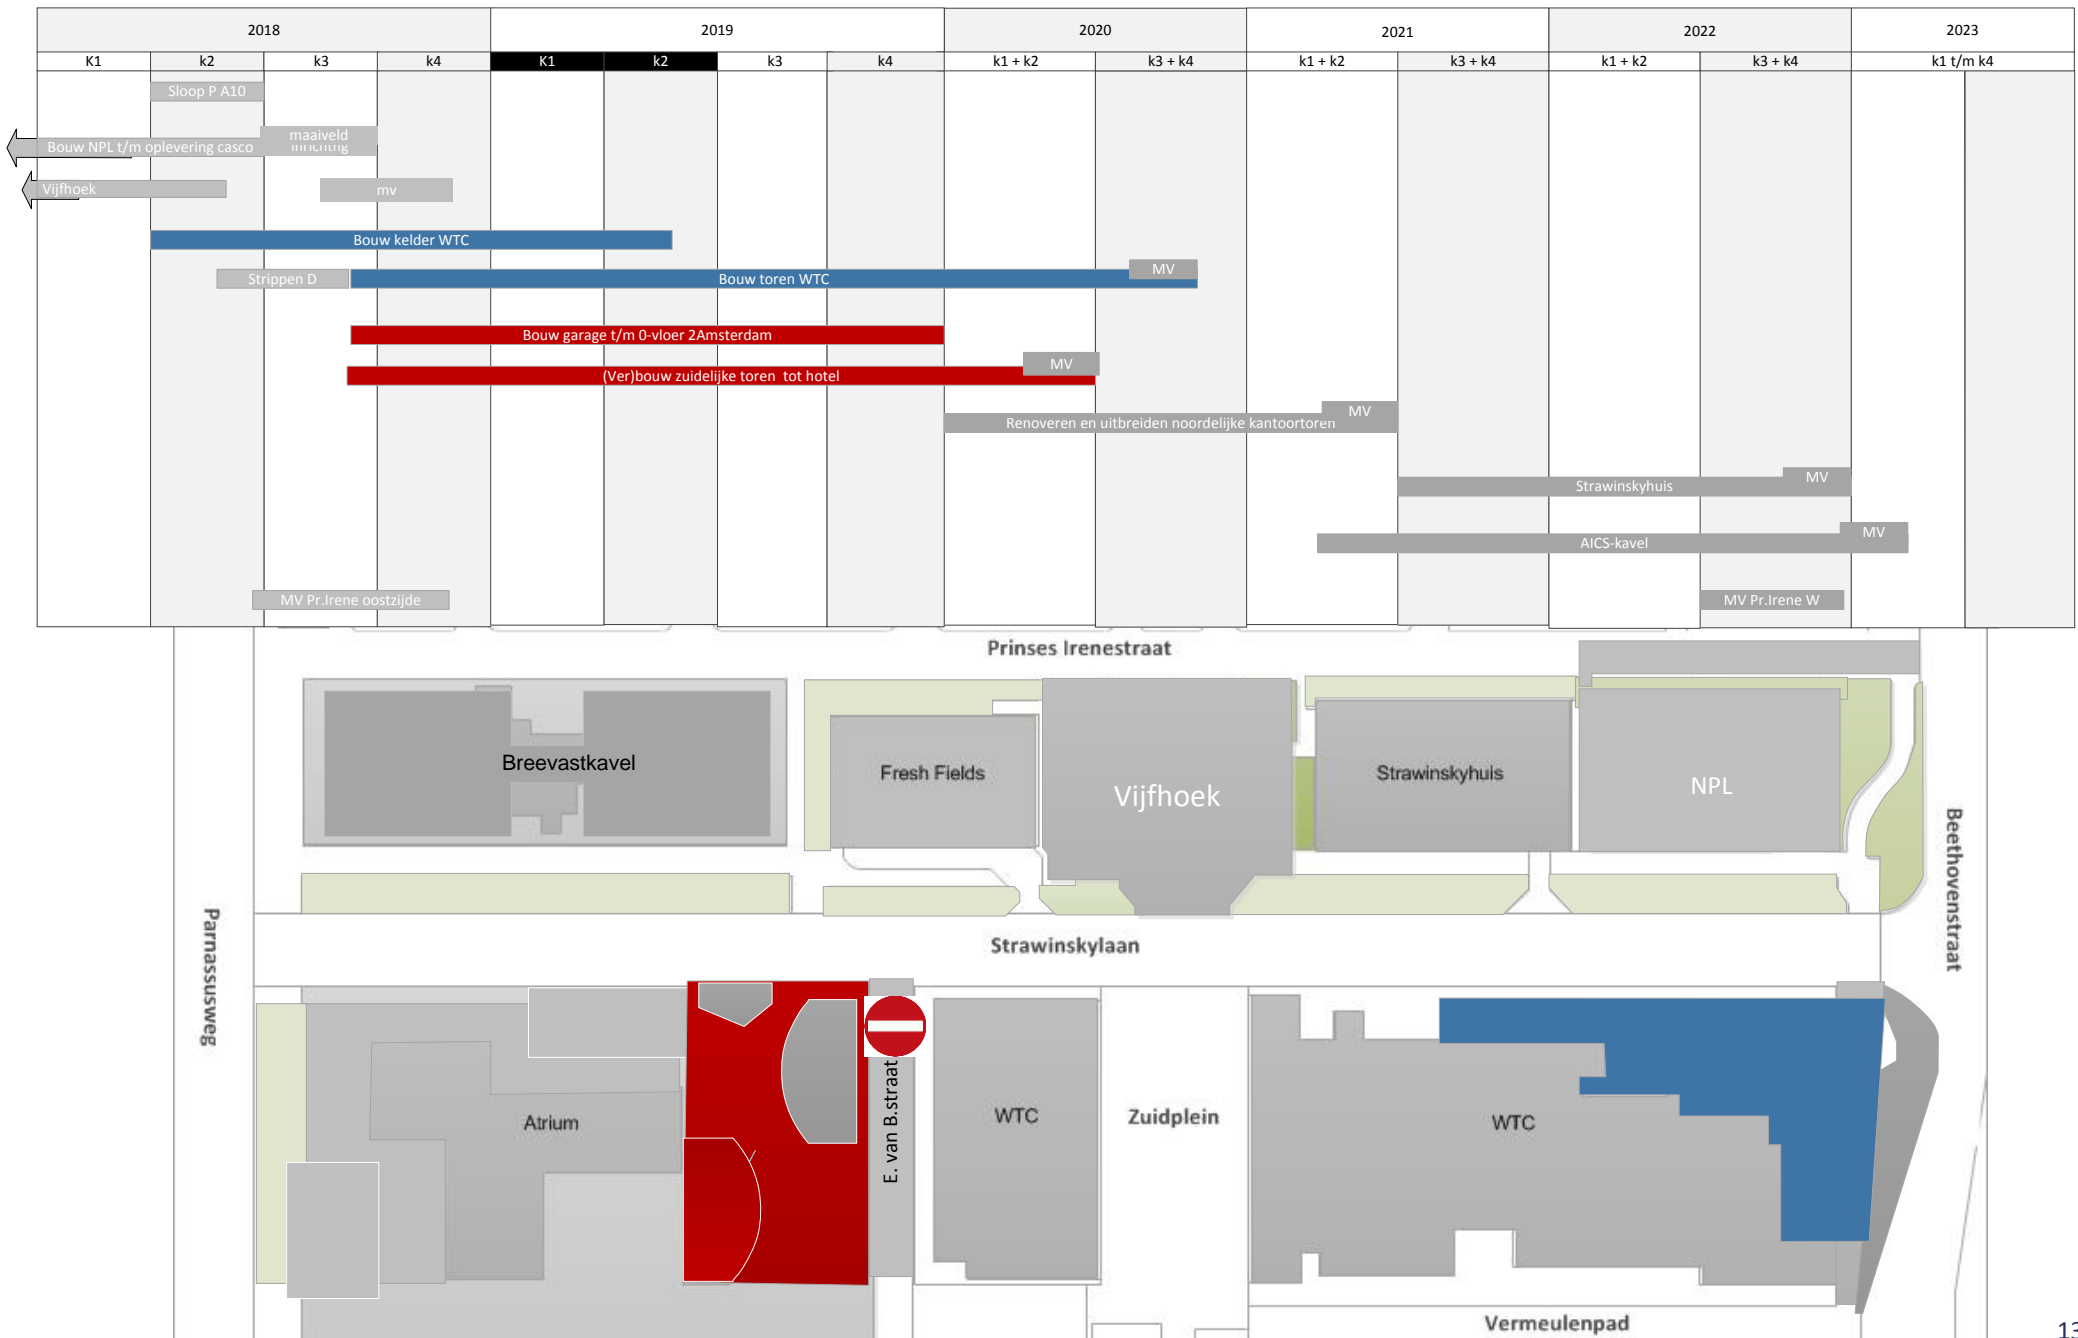


Stand van zaken bouwplannen

De uitbreiding van de parkeergarage P1 en P2, WTC, is gereed. De uitbreiding en revitalisering van toren D duren tot in het vierde kwartaal van 2020.

Eind vierde kwartaal / begin 1e kwartaal 2020 zijn de werkzaamheden voor de ondergrondse parkeerbak 2Amsterdam gereed. Daarna kan de (ver)bouw van de noordelijke toren starten.

Maaiveld

Strawinsky 3e en 4e kwartaal 2019

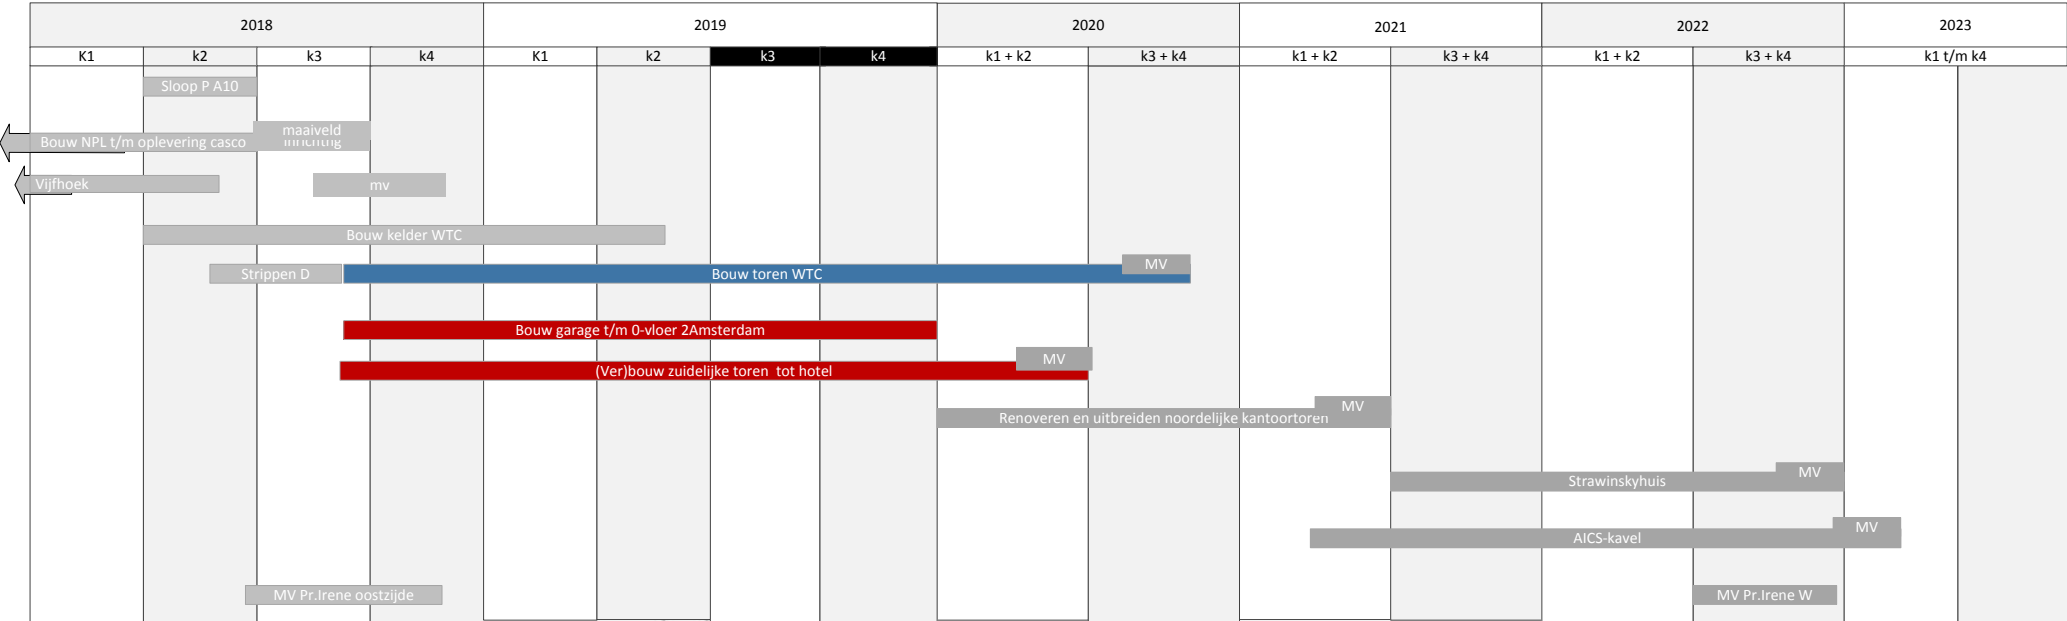

Stand van zaken bouwplannen



De werkzaamheden aan de revitalisering en uitbreiding toren D, WTC lopen door tot in het vierde kwartaal van 2020.

De werkzaamheden voor de ondergrondse parkeerbak 2Amsterdam zijn gereed. Gestart is met de (ver)bouw van de noordelijke toren. De zuidelijke toren is eind tweede kwartaal 2020 gereed.

Maaiveld

Gestart wordt met de maaiveldinrichting 2Amsterdam.

Strawinsky 1e en 2e kwartaal 2020

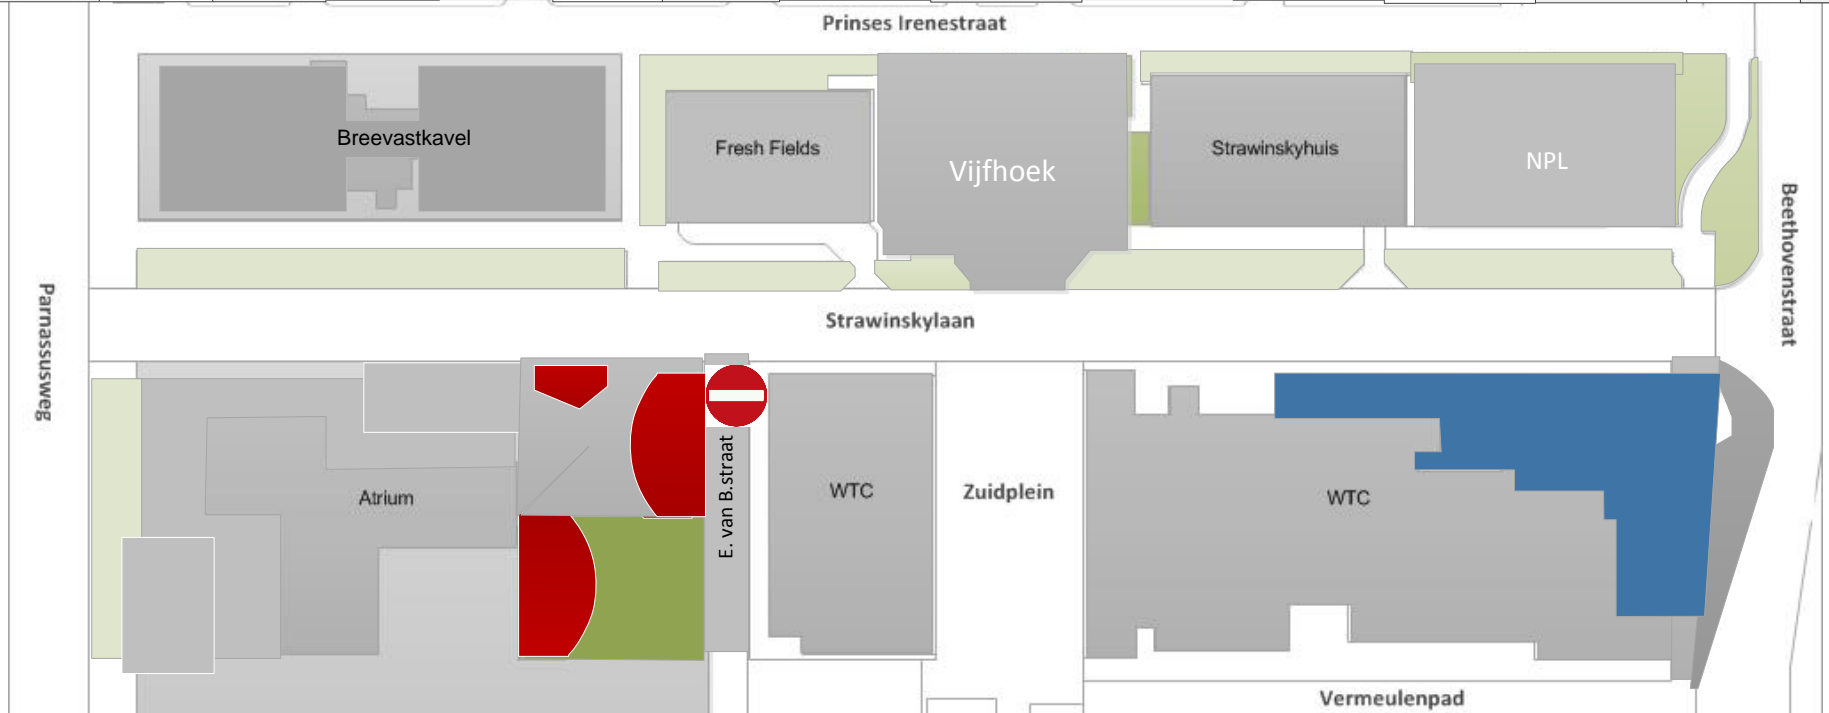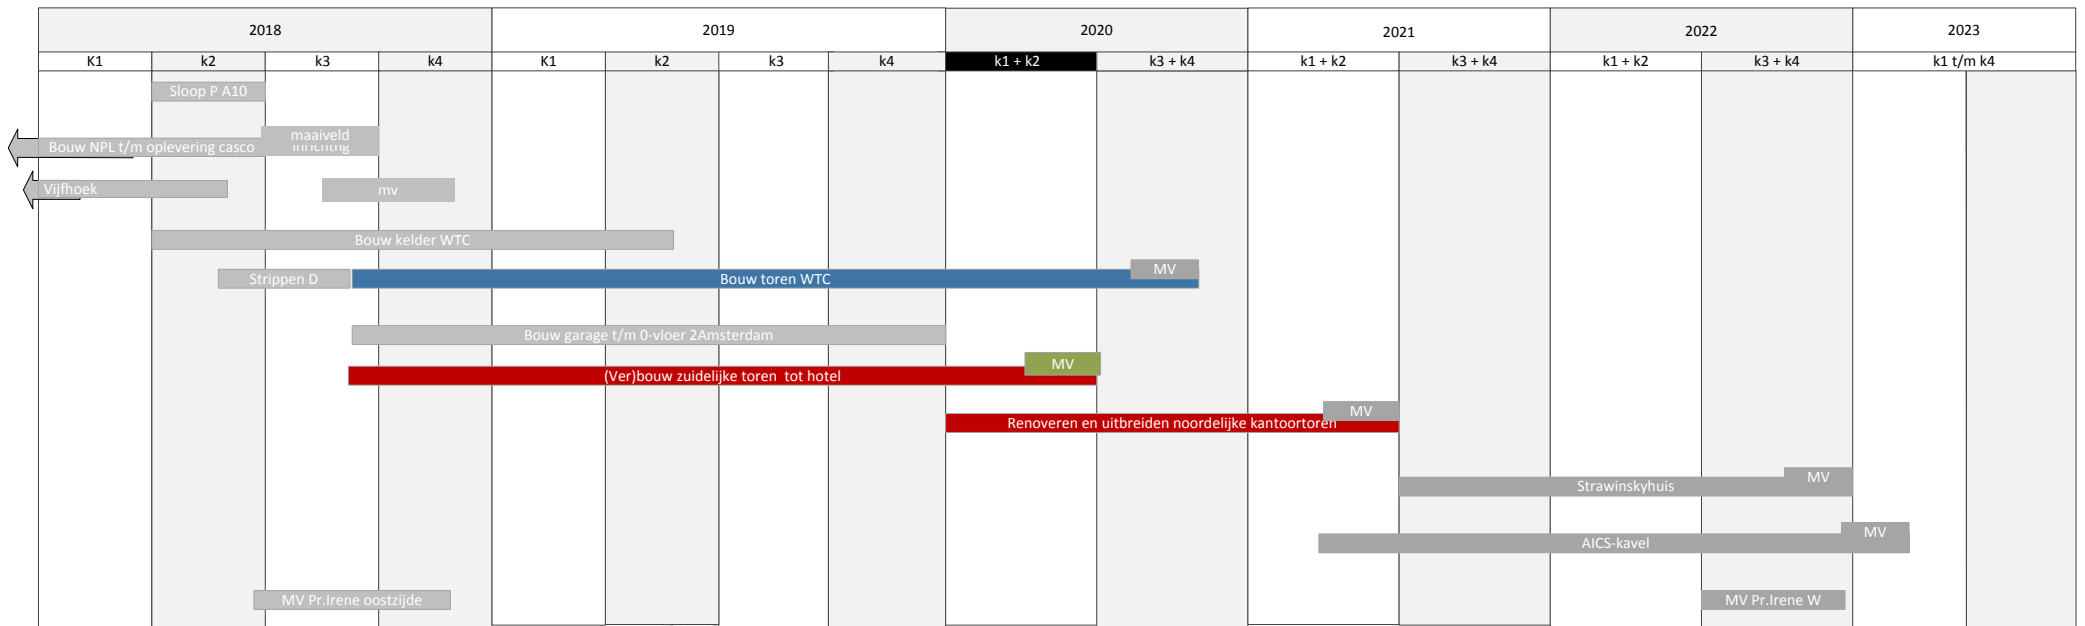

Stand van zaken bouwplannen


De (ver)bouw van de noordelijke toren, 2Amsterdam, loopt. De zuidelijke toren is eind tweede kwartaal 2020 in gebruik genomen als hotel.

Maaiveld

Het maaiveld 2Amsterdam is ingericht.

De E. van Beinumstraat wordt eind juli 2020 weer open gesteld.

Strawinsky 3e en 4e kwartaal 2020

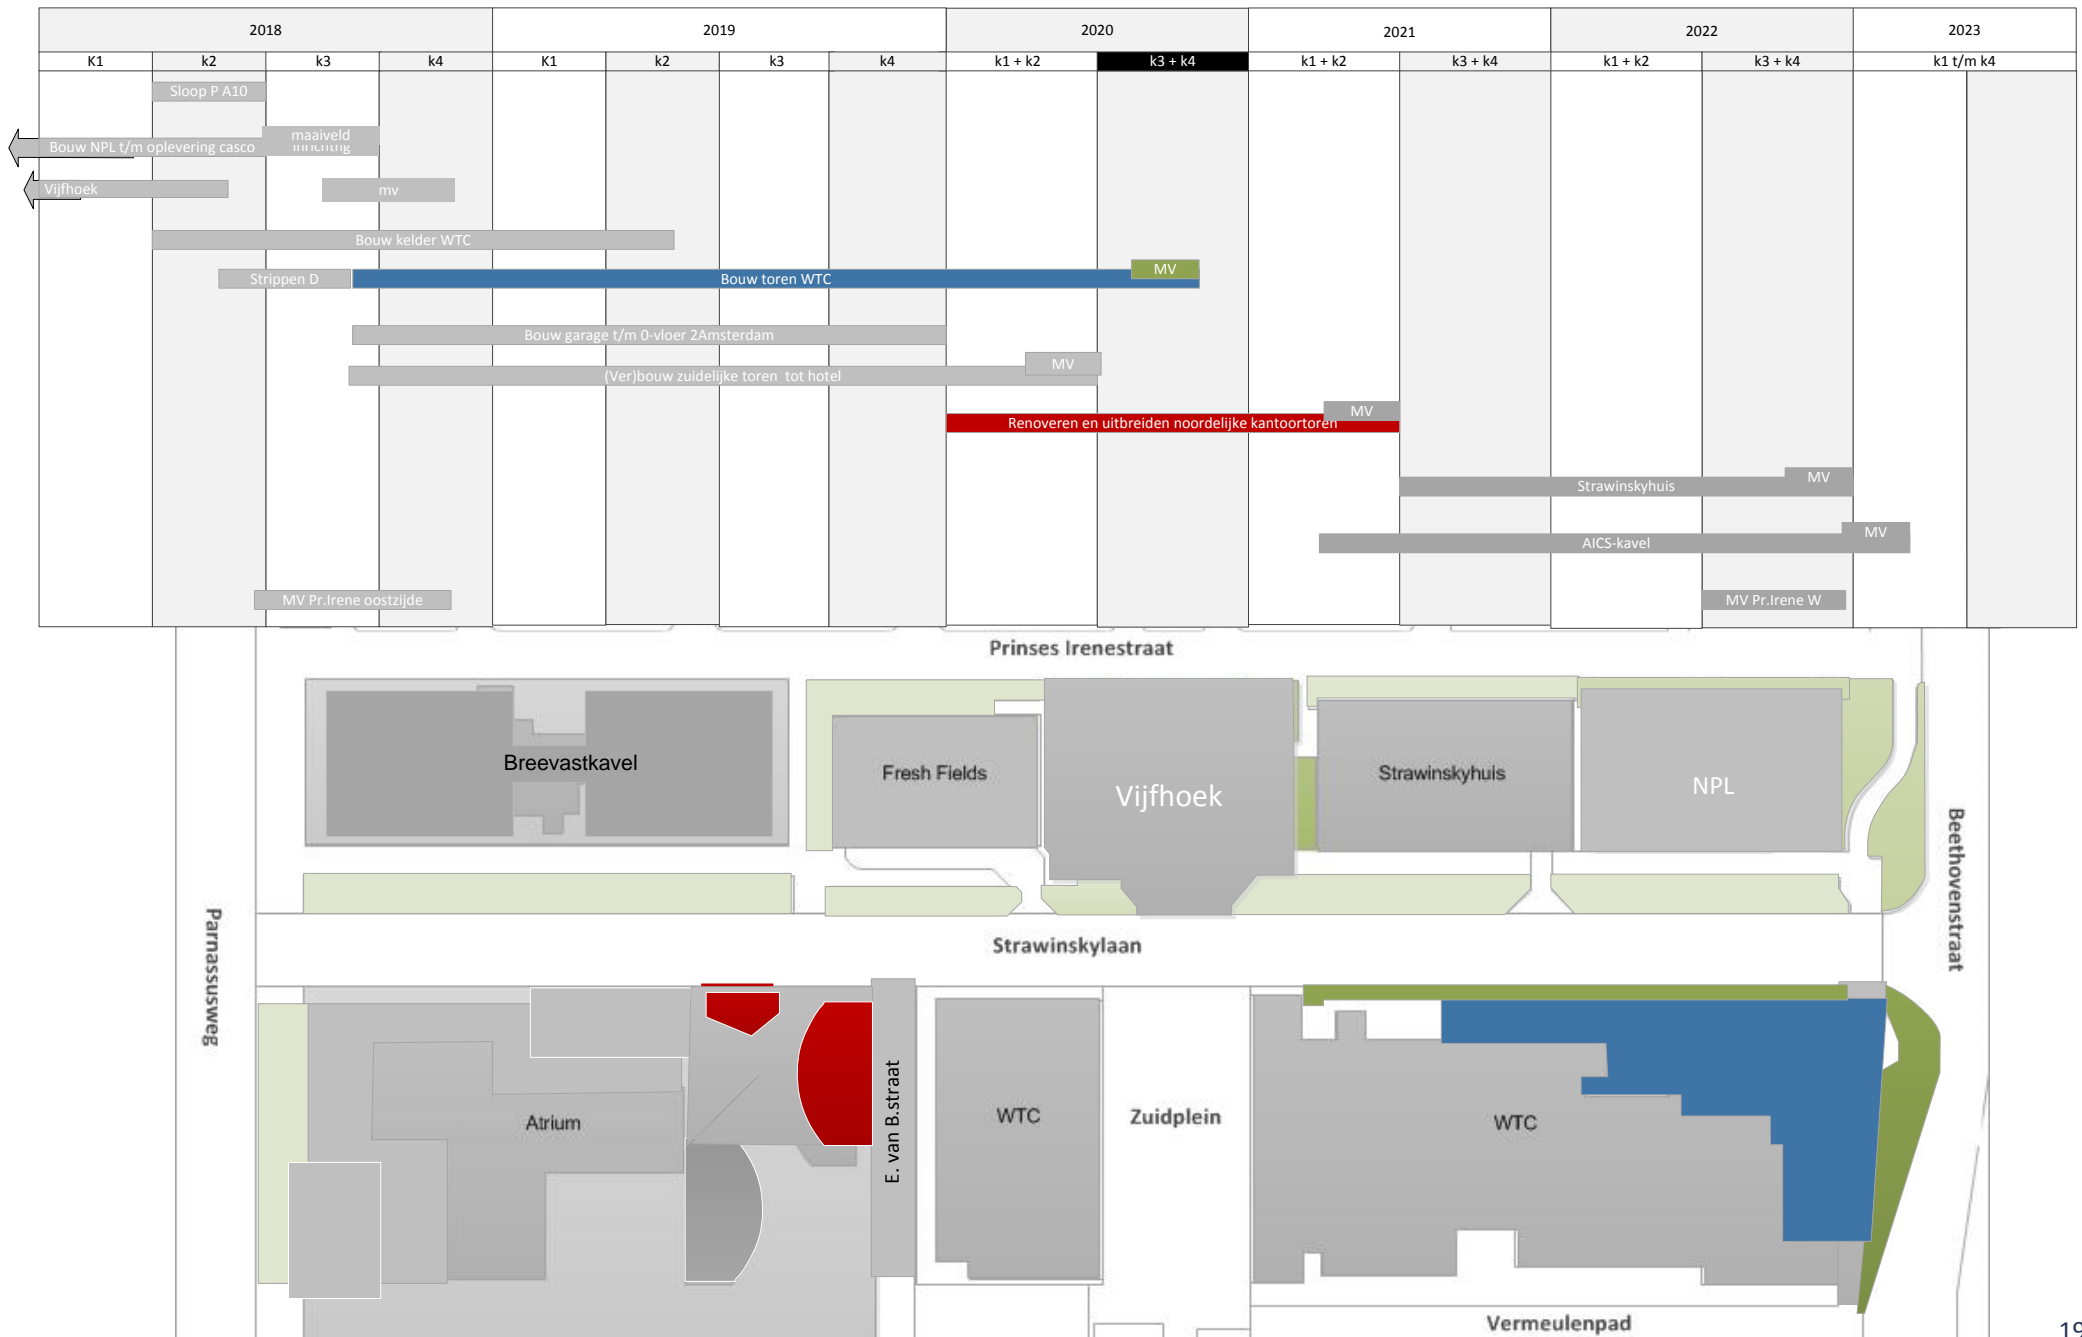

Strawinsky 1e en 2e kwartaal 2021

Stand van zaken bouwplannen

De werkzaamheden aan de uitbreiding en revitalisering toren D van het WTC zijn in het vierde kwartaal van 2020 afgerond en daarmee is de uitbreiding van het WTC gereed.

De (ver)bouw van de noordelijke toren 2Amsterdam loopt tot medio 2021.

Begin 2e kwartaal 2021 verhuist de AICS naar de nieuwe kavel. Vanaf dat moment kunnen de (sloop)werkzaamheden AICS op de Breevastkavel starten.



Maaiveld

Gestart wordt met de maaiveldinrichting 2Amsterdam rondom de noordelijke toren.

Op de Breevast kavel wordt in het eerste kwartaal gestart met bouwrijpmalen / inrichten bouwterrein.

Op de kavel Strawinskyhuis wordt hiermee in het tweede kwartaal gestart.

Strawinsky 1e en 2e kwartaal 2021

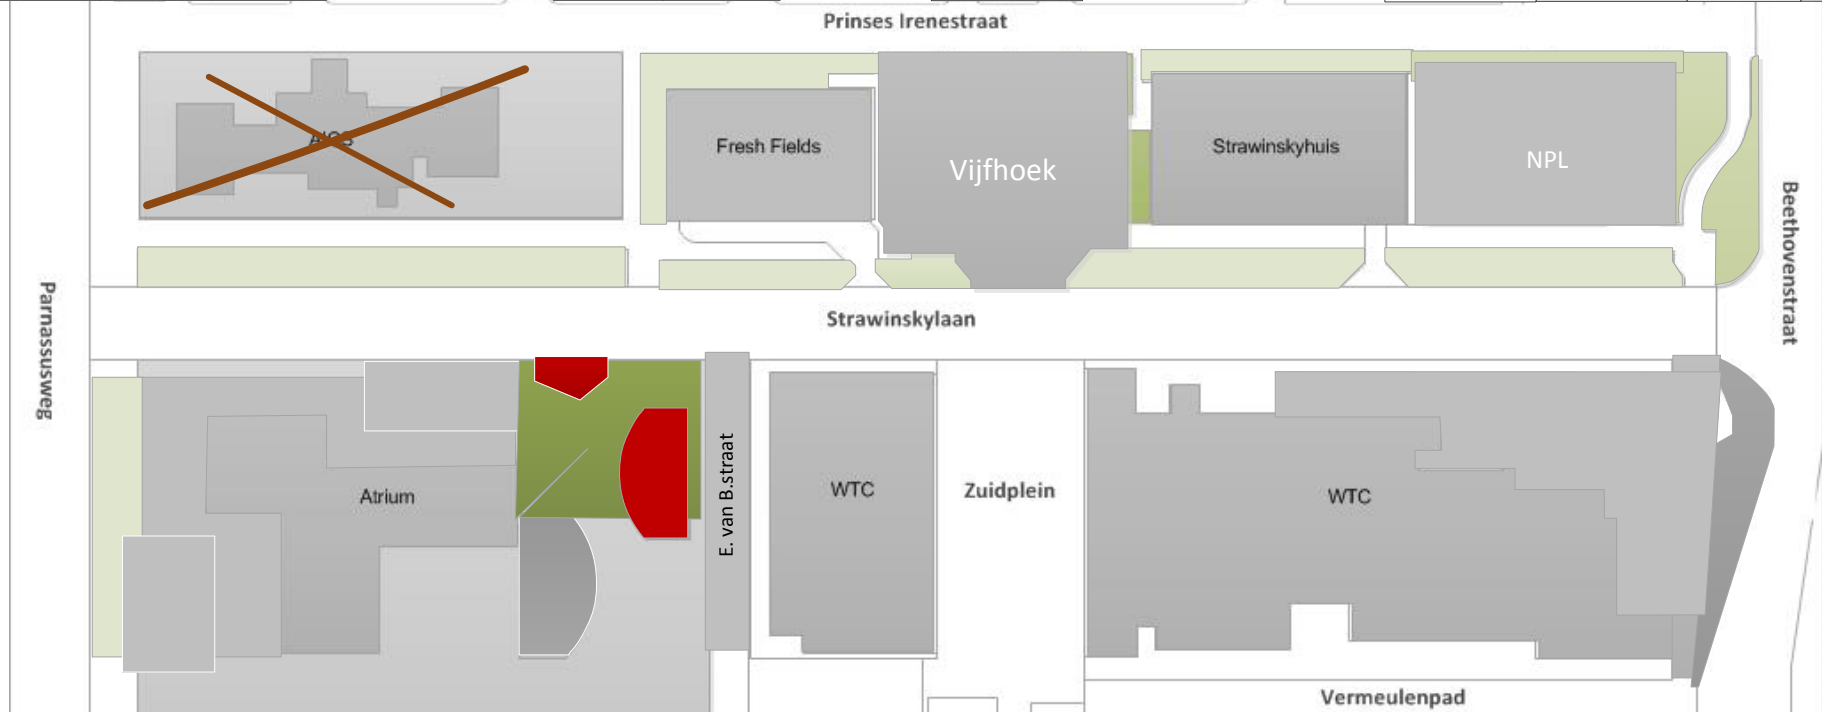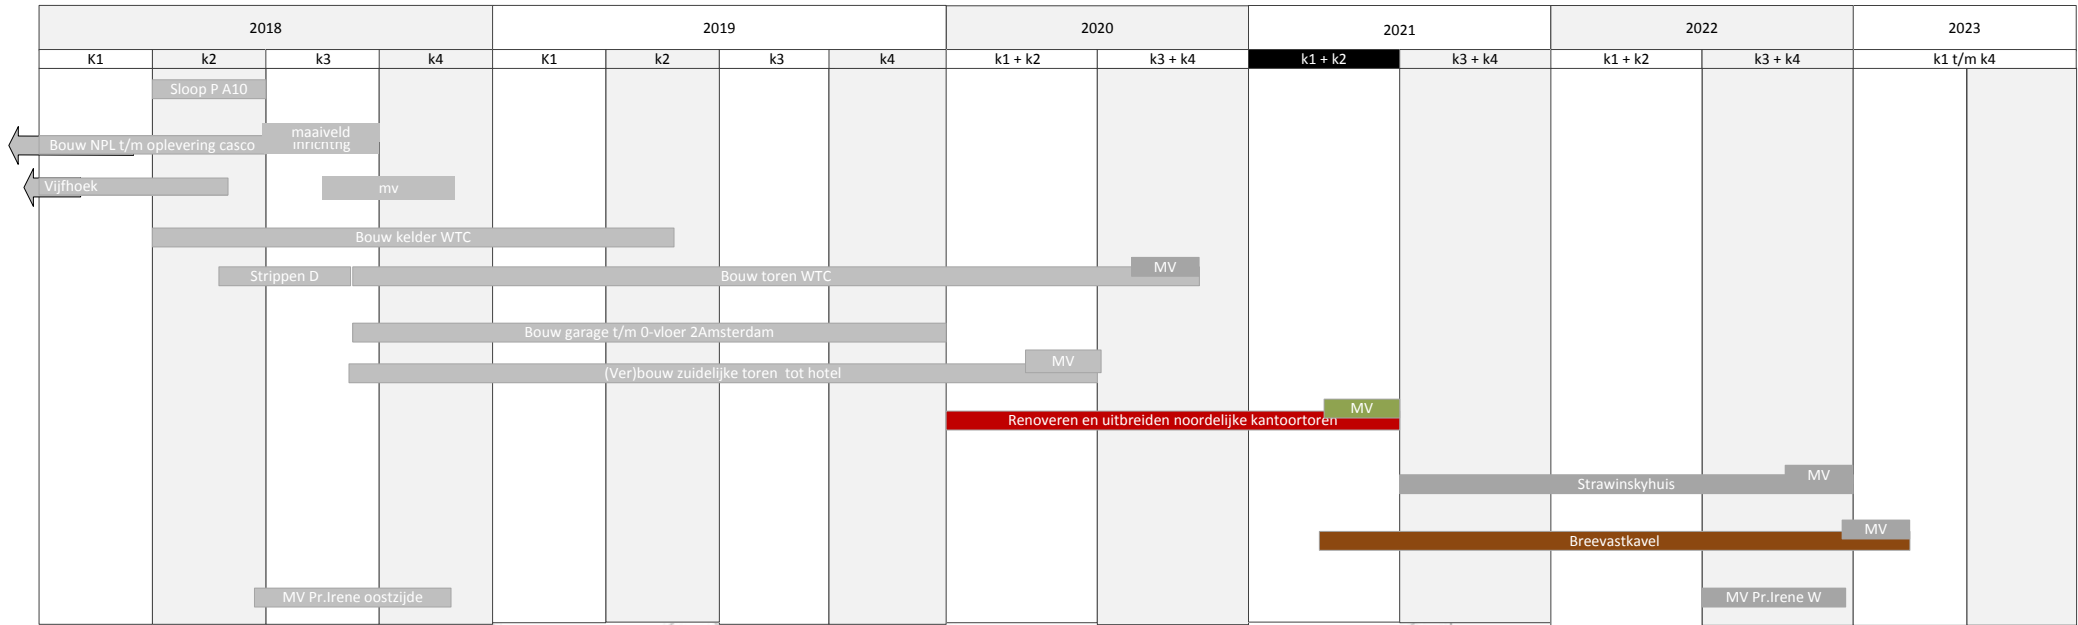

Stand van zaken bouwplannen

De (ver)bouw van de noordelijke toren 2Amsterdam is sinds eind tweede kwartaal gereed.


Begin 3e kwartaal 2021 is gestart met de (sloop)werkzaamheden Strawinskyhuis.

De werkzaamheden op de Breevastkavel lopen sinds het tweede kwartaal.

Maaiveld

De maaiveldinrichting 2Amsterdam is gereed.

Strawinsky 3e en 4e kwartaal 2021


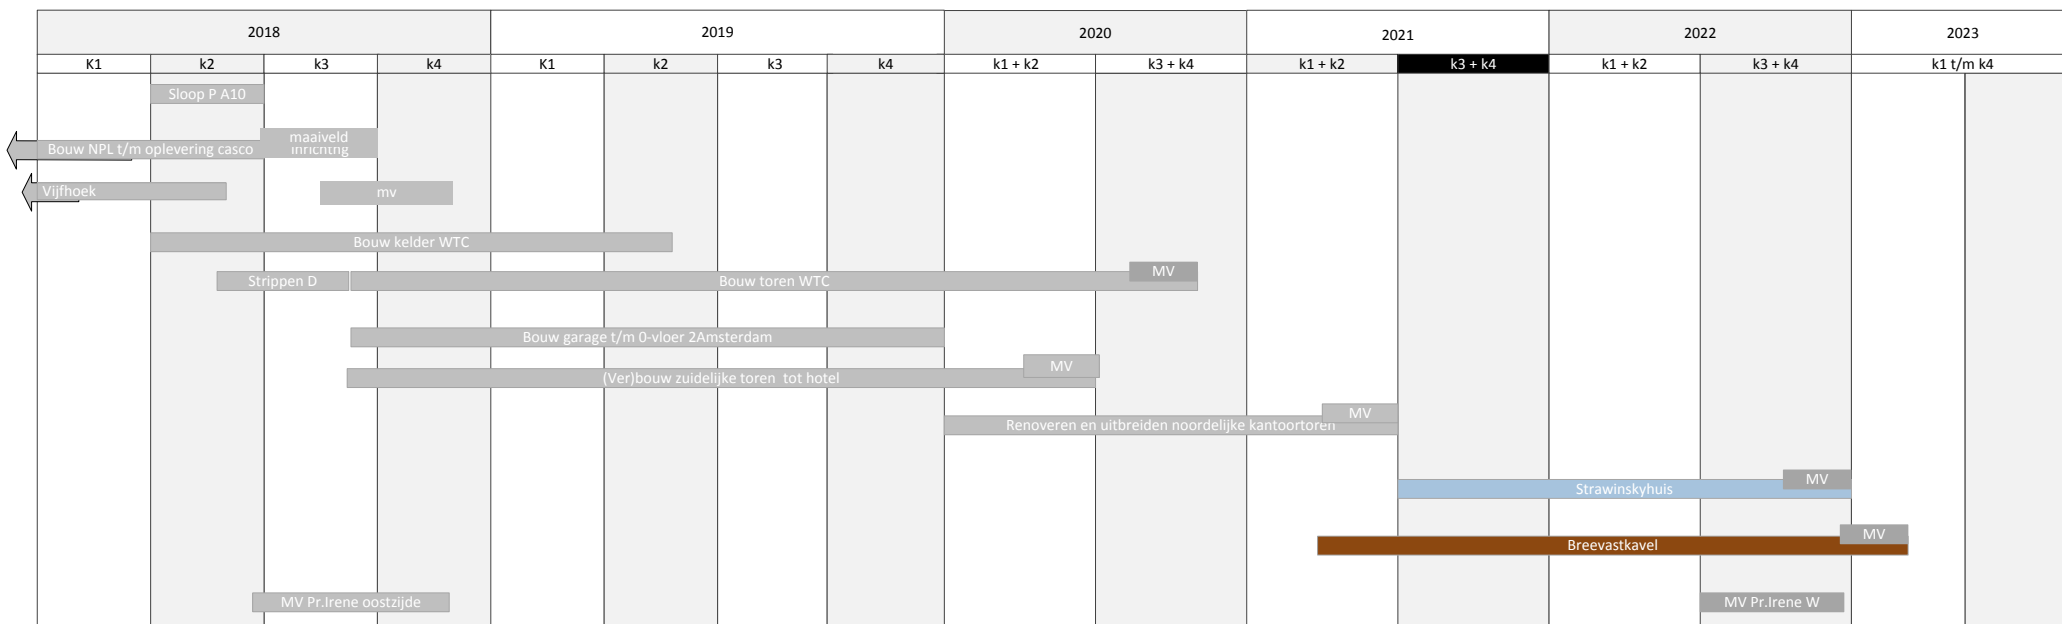


Stand van zaken bouwplannen

De werkzaamheden Strawinskyhuis en Breevastkavel lopen.

Maaiveld

Strawinsky 1e en 2e kwartaal 2022

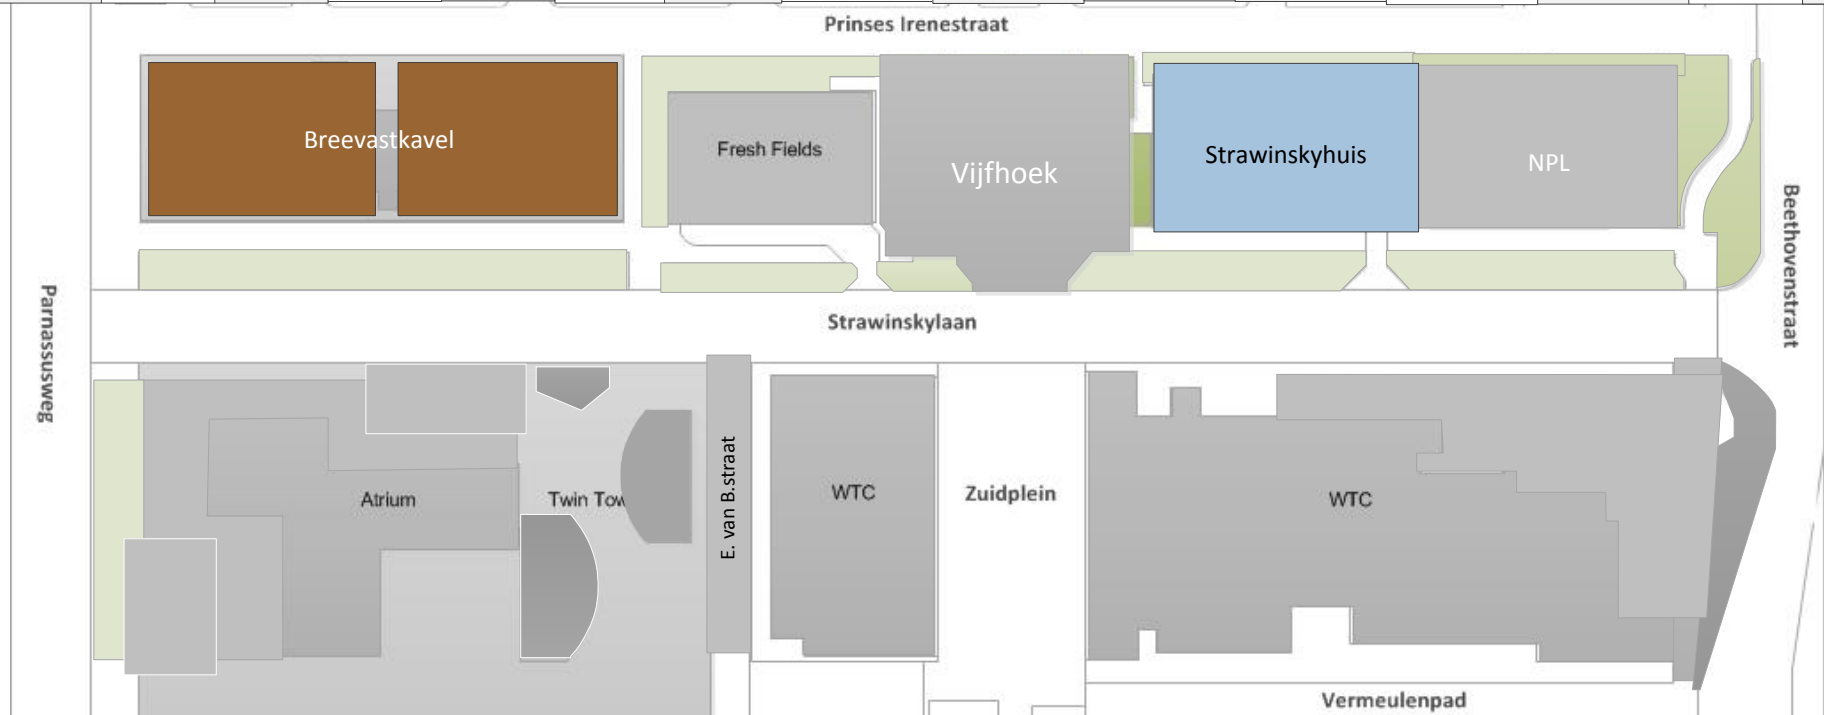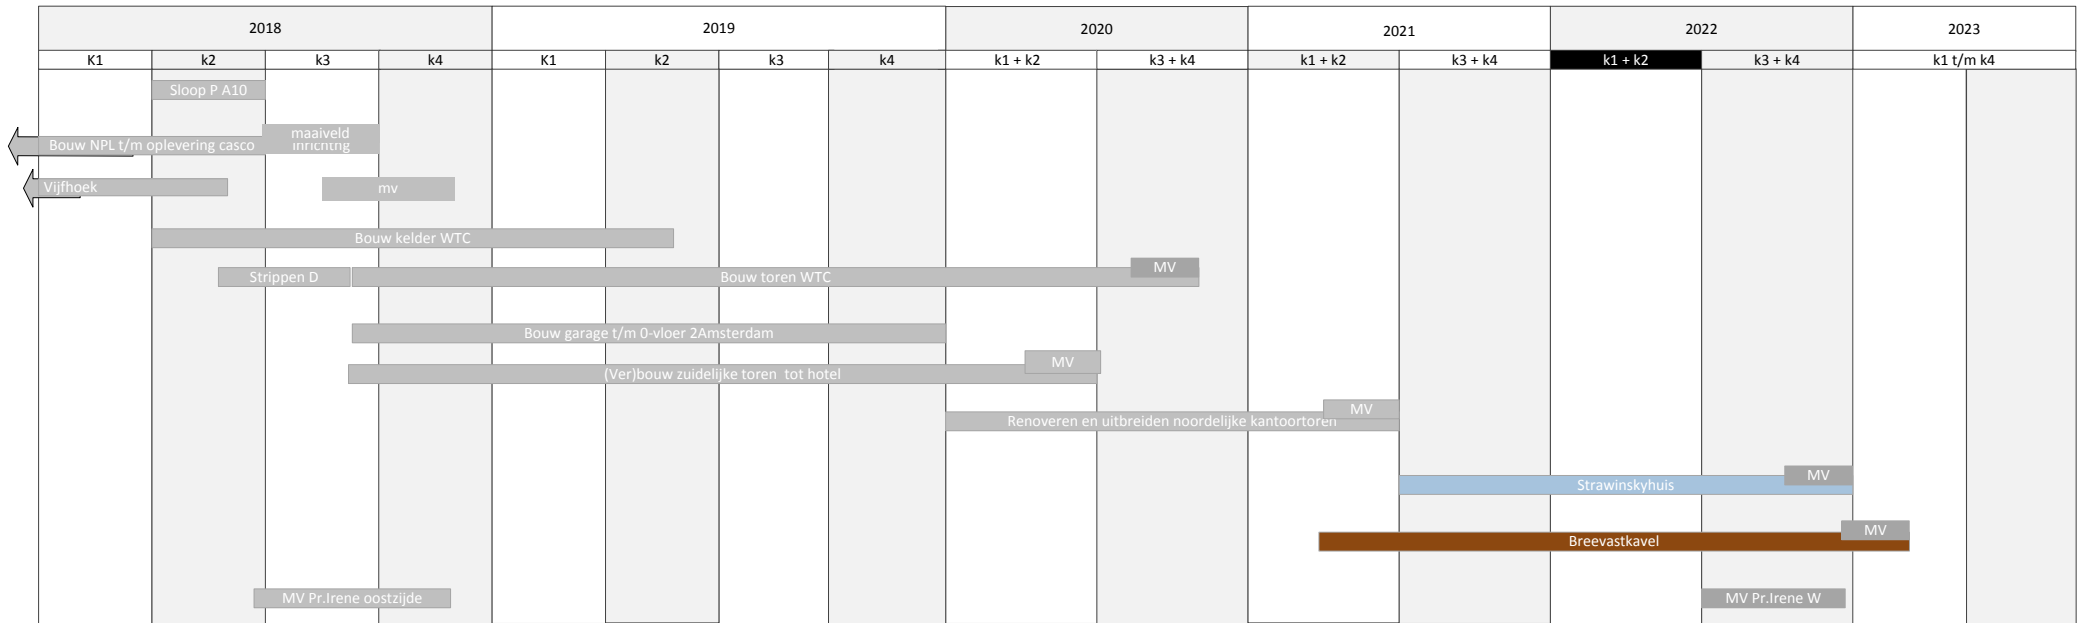

Stand van zaken bouwplannen



De werkzaamheden Strawinskyhuis en Breevastkavel lopen.

Maaiveld

In het derde kwartaal wordt gestart met de groenstrook Prinses Irenestraat westzijde, vanaf het Strawinskyhuis.

In het derde / vierde kwartaal wordt tevens gestart met de maaiveldinrichting van zowel de Breevastkavel als het Strawinskyhuis.

Strawinsky 3e en 4e kwartaal 2022

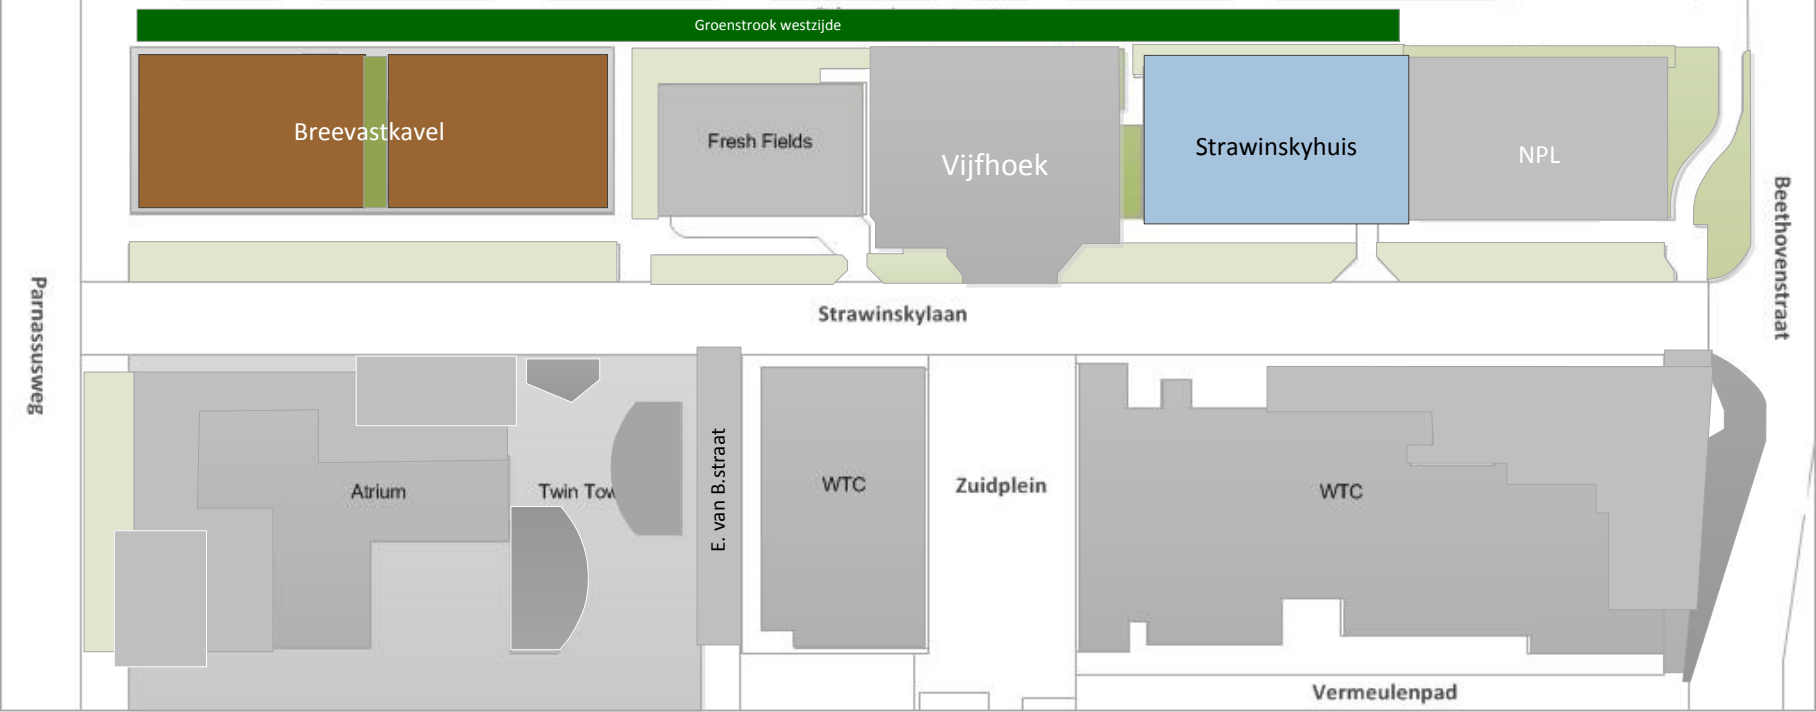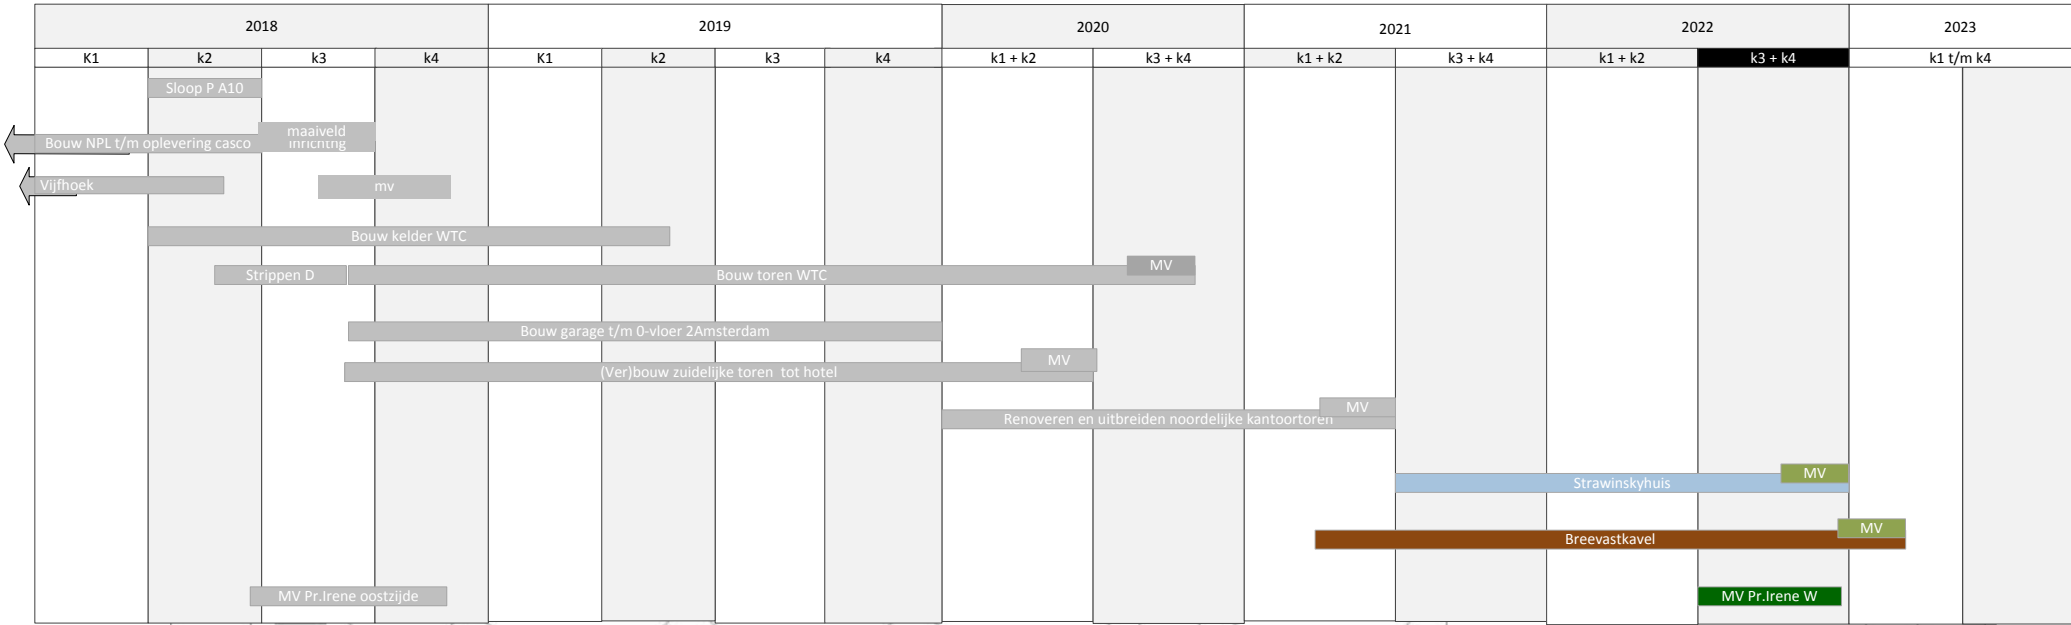

Stand van zaken bouwplannen

De bouwwerkzaamheden Strawinskyhuis, incl. inrichting maaiveld, zijn gereed.
De nieuwbouw Breevastkavel loopt tot in de eerste helft van 2023.

Maaiveld

De groenstrook Prinses Irenestraat westzijde is gereed

De laatste werkzaamheden maaiveldinrichting van de Breevastkavel worden uitgevoerd.

Strawinsky 2023

2018				2019				2020		2021		2022		2023	
K1	k2	k3	k4	K1	k2	k3	k4	k1 + k2	k3 + k4	k1 + k2	k3 + k4	k1 + k2	k3 + k4	k1 t/m k4	
	Sloop P A10														
Bouw NPL t/m oplevering casco		maaienveld inrichting													
Vijfhoek			mv												
	Bouw kelder WTC														
	Strippen D					Bouw toren WTC								MV	
				Bouw garage t/m 0-vloer 2Amsterdam											
				(Ver)bouw zuidelijke toren tot hotel										MV	
								Renoveren en uitbreiden noordelijke kantoortoren						MV	
													Strawinskyhuis		MV
											Breevastkavel			MV	
														MV Pr.Irene W	
														MV Pr.Irene oostzijde	



Strawinsky

